

2021年软考-中级 系统集成项目管理工程师 基础精讲班

-15项目沟通和干系人管理



讲师:朱建军 (江山老师)

第 12 章：项目沟通管理、干系人管理（3 分）																							
分值 \ 年份	09	09	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
考点情况	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	下
1、影响沟通因素/渠道				1																	1		
2、沟通计划编制			1	2			2		2			1		1	2								
3、信息分发/沟通技术									2	1	1	1	1	1									
4、绩效报告							1				1		1										
5、项目干系人管理						1						1		1		1	1		1		1		
6、会议/项目总结会			1												1								
7、沟通方式																	1					1	1
8、权力/利益方格																	1	1		1		1	1
9、控制沟通的方法																		1					
10、沟通的目标/工具																			1	1			
总的分值			2	3		1	3		4	1	2	3	2	3	3	1	3	2	2	2	2	2	2
学习建议：沟通管理、干系人管理比较重要，案例分析考的不多，重点掌历年考试重点，必须得分																							

沟通	高效会议的措施		05 下
干系人、	权利/利益方格	17 下	



沟通管理*IT0口诀版

10.1 规划沟通管理

1. 项目管理计划	1. 沟通需求分析	1. 沟通管理计划
2. 干系人登记册	2. 沟通技术	2. 项目文件更新
3. 事业环境因素	3. 沟通模型	
4. 组织过程资产	4. 沟通方法	
	5. 会议	
业组有计册	模方术分会	沟划新文件
4	5	2

10.2 管理沟通

1. 沟通管理计划	1. 沟通技术	1. 项目沟通
2. 工作绩效报告	2. 沟通模型	2. 项目管理计划更新
3. 事业环境因素	3. 沟通方法	3. 项目文件更新
4. 组织过程资产	4. 信息管理系统	4. 组织过程资产更新
	5. 报告绩效	
4	5	4
沟管报业组	模方术报信	沟新文件组

10.3 控制沟通

1. 项目管理计划	1. 信息管理系统	1. 工作绩效信息
2. 项目沟通	2. 专家判断	2. 变更请求
3. 问题日志	3. 会议	3. 项目管理计划更新
4. 工作绩效数据		4. 项目文件更新
5. 组织过程资产		5. 组织过程资产更新
沟划问组数	专家系统会	输出5大件
5	3	5

4W1H	规划沟通管理	管理沟通	监控沟通
what 做什么	制定一份沟通管理计划，定义沟通方法，明确针对不同的干系人使用何种沟通方法和沟通方式/媒介，对干系人发布何种信息等 作用：识别和记录与干系人的最有效率且最有效果的沟通方式	按照计划生成、收集、分发、存储、检索、最终处置项目信息。 作用：促进项目干系人之间有效率且有效果的沟通	在整个项目周期中对沟通进行监督和控制，满足干系人对信息的需求。 作用：随时确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化
why 为什么做	良好的沟通是项目成功的必须，项目经理必须做好沟，项目经理 90%的时间用来沟，目的是整合项目工作，达成目目标	实现有效率、有效果沟通	重视对干系人期望的管理，确保项目成功
who 谁来做	项目经理和项目管理团队/项目团队（如果项目规模比较小的话）	项目管理团队/项目团队（如果项目规模比较小的话）	项目管理团队/项目团队（如果项目规模比较小的话）
when 什么时候做	项目早期，项目章程批准后，开始制定项目沟通管理计划	计划制定后，按照计划执行	贯穿项目生命周期始终
how 如何做	采用沟通需求分析，沟通技术，沟通方，沟通模型和沟通方法	使用沟通技术、沟通模型、沟通方法、信息管理系统和报告绩效工具	信息管理系统，专家判断，会议

影响沟通技术选择的因素：信息需求的紧迫性(紧迫性、频率和形式)，技术的可用性(对所有干系人都具有兼容性、有效性和开放性)，易用性(适合项目参与者)，项目环境，信息的敏感性和保密性(是否需采取特别的安全措施)

项目沟通管理

识别和记录与干系人的最有效率且最有效果的沟通方式

10.1 规划沟通管理

有效率
有效果

何时以及需要收集哪些信息

.1 输入

规划

- 1 项目管理计划
- 2 干系人登记册(识别干系人的输出)
- 3 事业环境因素(沟通需要适应项目环境)
- 4 组织过程资产

潜在沟通渠道= $n(n-1)/2$

.2 工具与技术

- 1 沟通需求分析(确定项目干系人的信息需求及价值)
(确定和限制谁与谁沟通，谁将接收何等信息)
- 2 沟通技术
- 3 沟通模型(项目资源只能用来沟通有利于项目成功的信息，或那些因缺乏沟通会造成失败的信息)
- 4 沟通方法
- 5 会议

规划沟通管理的目的：根据对信息的沟通需求，定义沟通方法和计划

.3 输出

- 1 沟通管理计划(包括通用术语表、沟通模型的因素)
- 2 项目文件更新(项目进度计划、干系人登记册)

有效果的沟通：以正确的形式、在正确的时间把信息提供给正确的受众，并且使信息产生正确的影响

有效率的沟通：只提供所需要的信息

促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通

10.2 管理沟通

执行

.1 输入

- 1 沟通管理计划
- 2 工作绩效报告
- 3 事业环境因素(组织文化和结构、行业标准和规定、PMIS)
- 4 组织过程资产

.2 工具与技术

- 1 沟通技术
- 2 沟通模型
- 3 沟通方法(推式、拉式、交互式)
- 4 信息管理系统(不限于介质，属于PMIS)
- 5 报告绩效(状态报告、进展测量结果及预测结果)

管理沟通的目的：生成/收集/分发/储存/检索/处置项目信息

.3 输出

- 1 项目沟通
- 2 项目管理计划更新
- 3 项目文件更新(问题日志、项目进度计划、项目资金需求)
- 4 组织过程资产更新(含项目收尾报告)

组织过程资产更新：给干系人的通知、项目演示资料、项目记录、干系人的反馈意见、经验教训文档、项目报告(包括经验教训总结、问题日志、项目收尾报告和其他知识领域的相关报告)

随时确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化

10.3 控制沟通

监控

.1 输入

- 1 项目管理计划
- 2 项目沟通
- 3 问题日志(管理干系人参与的输出)
- 4 工作绩效数据
- 5 组织过程资产

.2 工具与技术

- 1 信息管理系统(不限于介质，属于PMIS)
- 2 专家判断
- 3 会议

控制沟通的目的：对沟通进行监督


.3 输出 和控制，满足干系人对信息的需求

- 1 工作绩效信息
- 2 变更请求
- 3 项目管理计划更新(9.1+10.1+13.2)
- 4 项目文件更新(预测、绩效报告、问题日志)
- 5 组织过程资产更新(报告格式、经验教训文档)


沟通渠道

公式: $M = n * (n - 1) / 2$, 其中 $n \geq 1$
应灵活选择沟通渠道

沟通模型

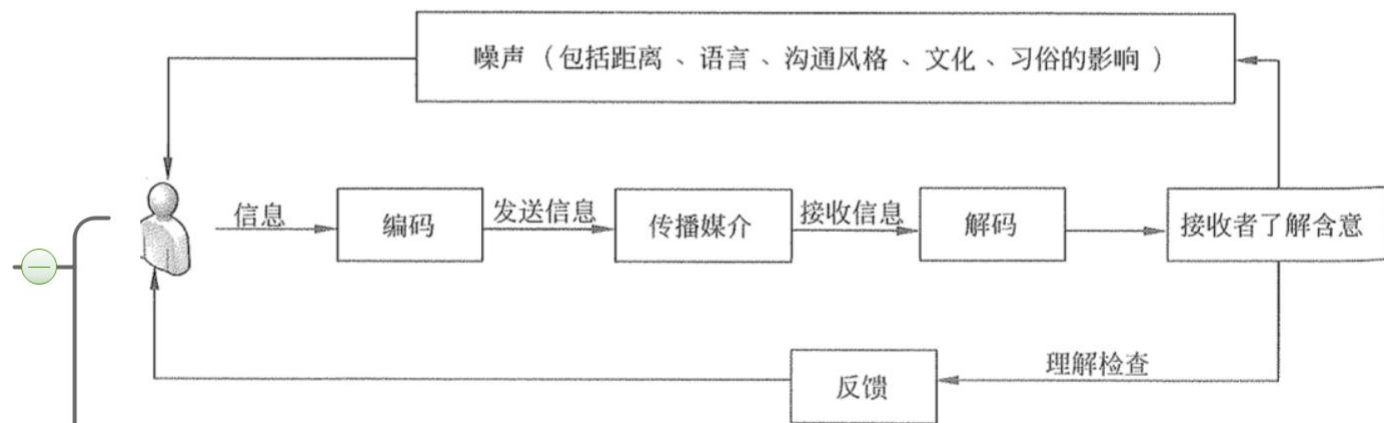



噪音的三种形式：①外部噪音②内部噪音③语义噪音

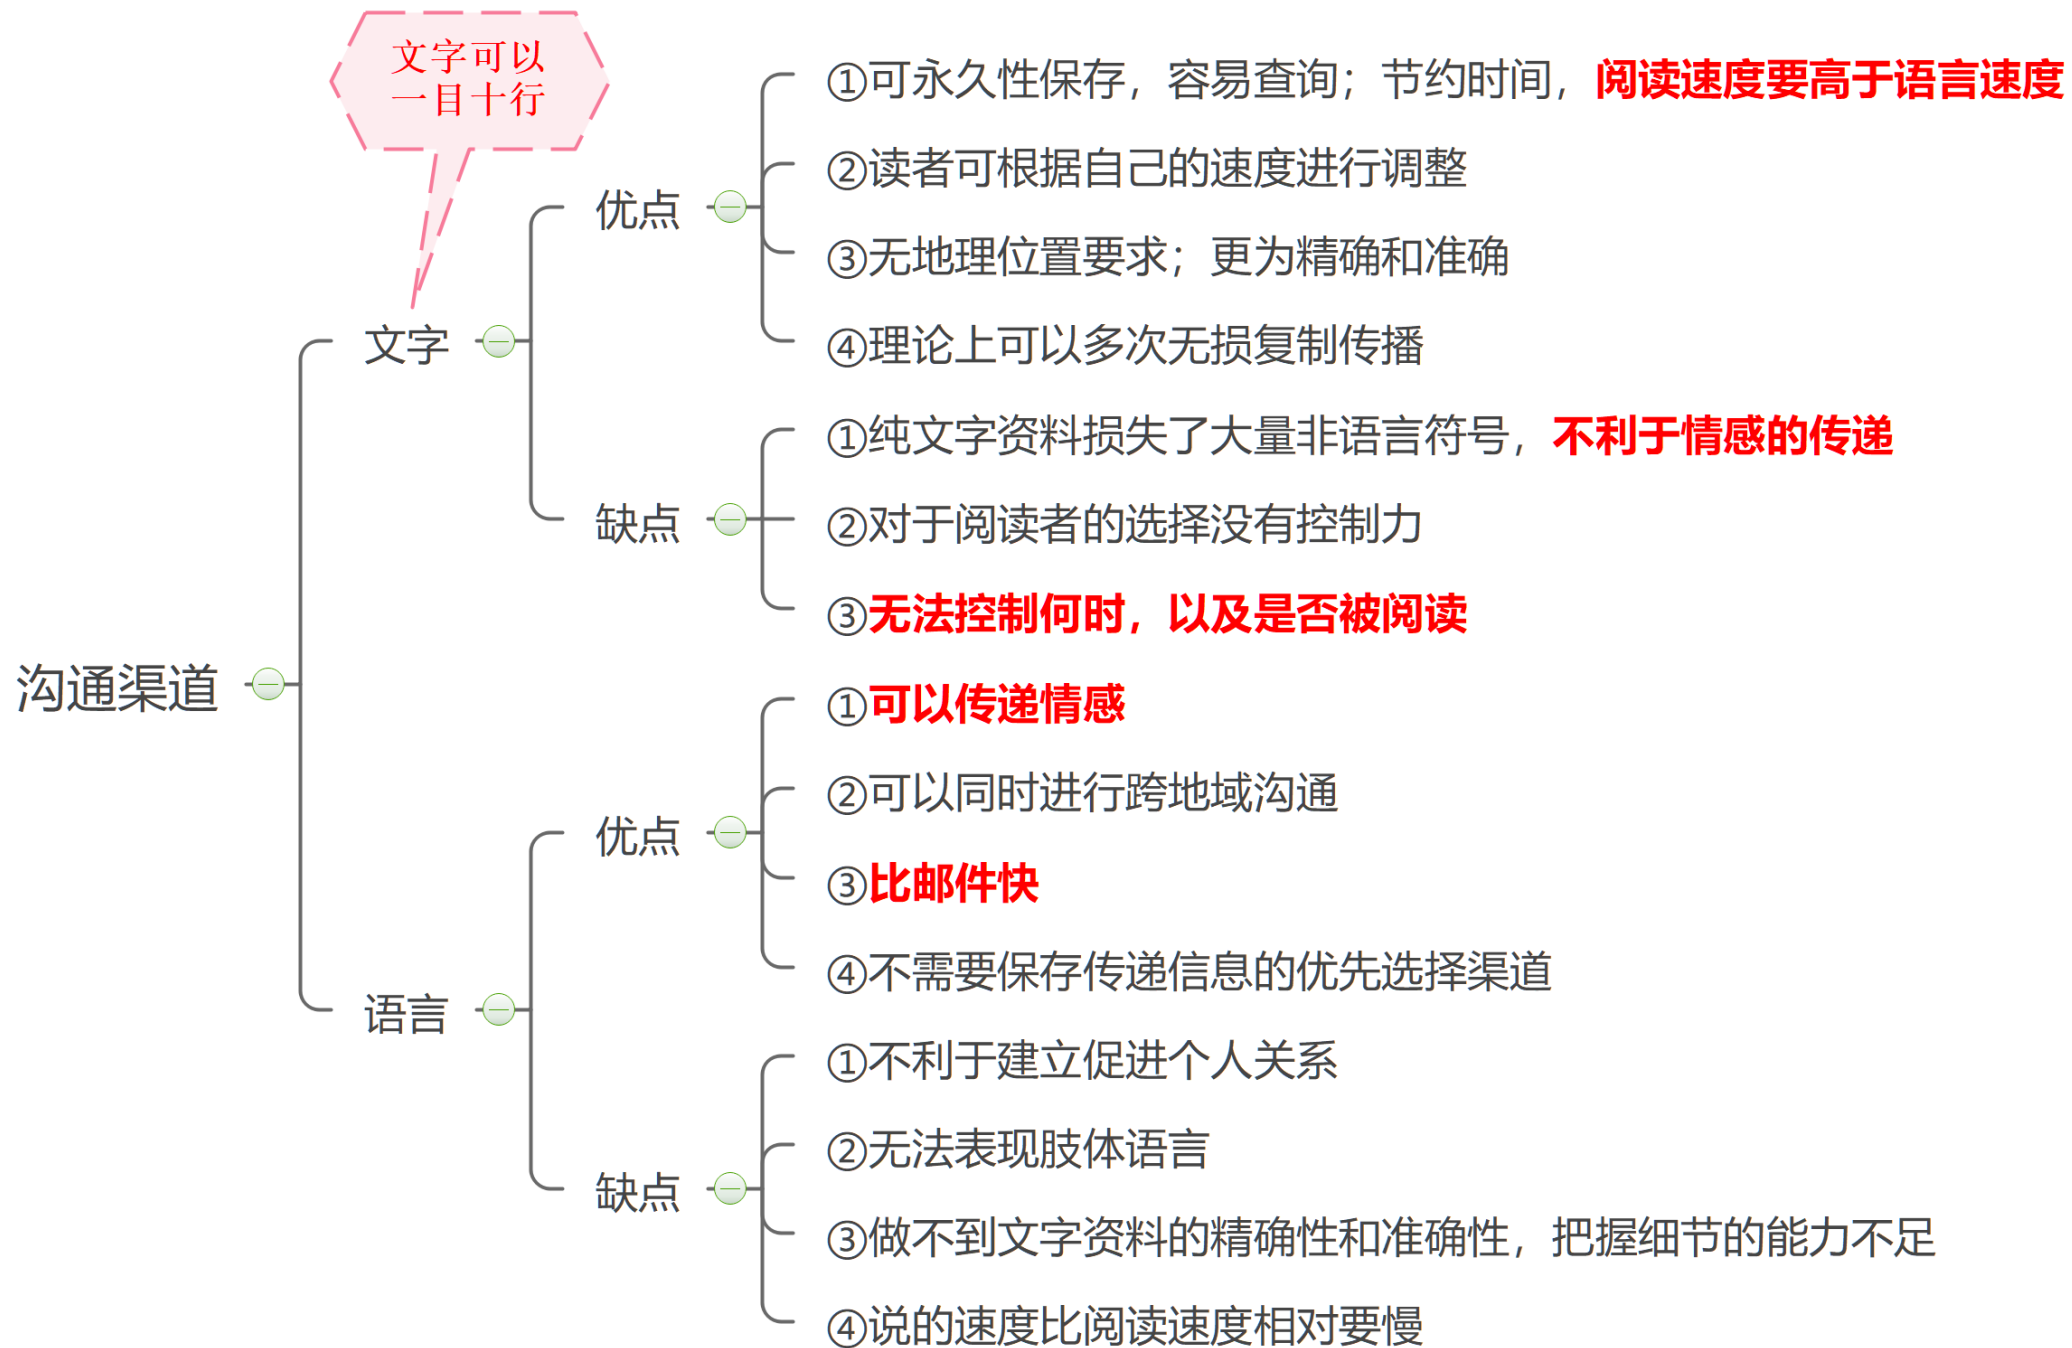

定义

在项目的**早期**，应该随着项目管理计划的制订，就着手制订项目沟通管理计划，根据项目的规模大小以及涉及的干系人的特点，**可以单独制订项目沟通管理计划，也可以将沟通管理计划作为项目整个管理计划的一部分而不需要形成单独的文档**

沟通管理计划可以以多种方式存在，**正式的或非正式的、详细的或简单概括的、包括在项目总体管理计划内或者项目总体管理计划的从属部分等**

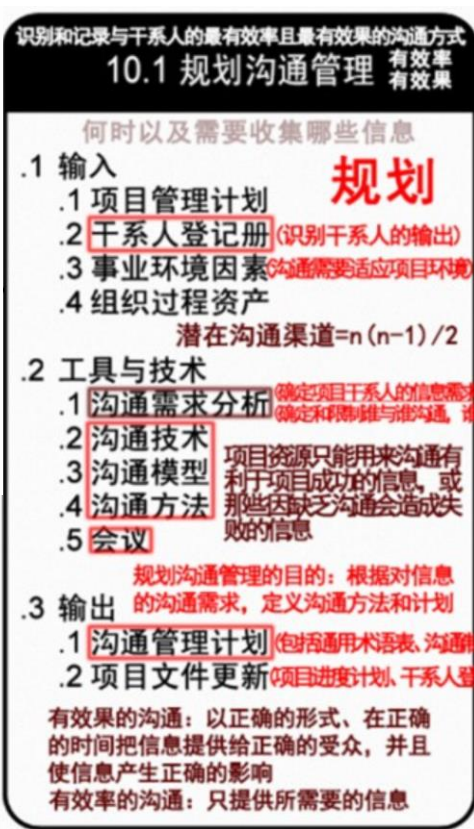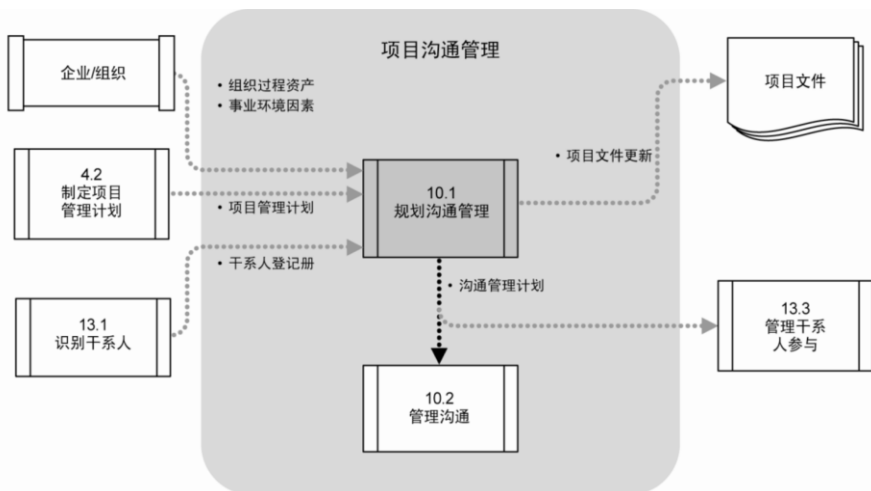

输入

①项目管理计划

②干系人登记册

③事业环境因素

④组织过程资产

①沟通需求分析

②沟通技术

③沟通模型

④沟通方法

⑤会议

会议方式是最常见的一种沟通渠道。会议的管理和控制都是非常重要的

成功会议的特征：①会议有准备
②会中有控制③会后有结论

输出

①沟通管理计划

②项目文件更新

1.规划沟通管理

沟通管理 计划内容

- 1.干系人的沟通需求
- 2.针对沟通信息的描述，包括格式、内容、详尽程度等
- 3.发布信息的原因
- 4.负责信息沟通工作的具体**人员**
- 5.负责信息保密工作的具体**人员**的授权
- 6.信息接收的个人或组织
- 7.**沟通渠道的选择**
- 8.信息传递过程中所需的**技术或方法**
- 9.进行有效沟通所必须分配的各种资源，包括时间和预算
- 10.**沟通频率**，例如，每周沟通等
- 11.**上报过程**，针对下层无法解决的问题，确定问题上报的时间要求和上报路径
- 12.项目进行过程中，对沟通管理计划更新与细化的方法
- 13.通用词语表、术语表
- 14.项目信息流向图、工作流程图、授权顺序、报告清单，会议计划等
- 15.沟通过程中可能存在的各种**制约因素**
- 16.沟通工作指导以及相关**模板**
- 17.有利于有效沟通的其他方面，比如，建议的搜索引擎，软件使用手册等

1.规划沟通管理

定义

包括生成、收集、发布、存储、检索、处置项目信息等过程
进行沟通过程管理的最终目标，就是保障干系人之间有效地沟通

ITO

输入


- ①沟通管理计划
- ②工作绩效报告
- ③事业环境因素
- ④组织过程资产

工具

- ①沟通技术
- ②沟通模型
- ③沟通方法
- ④信息系统
- ⑤报告绩效

输出

- ①项目沟通
- ②更新的项目管理计划
- ③更新的项目文件
- ④更新的组织过程资产

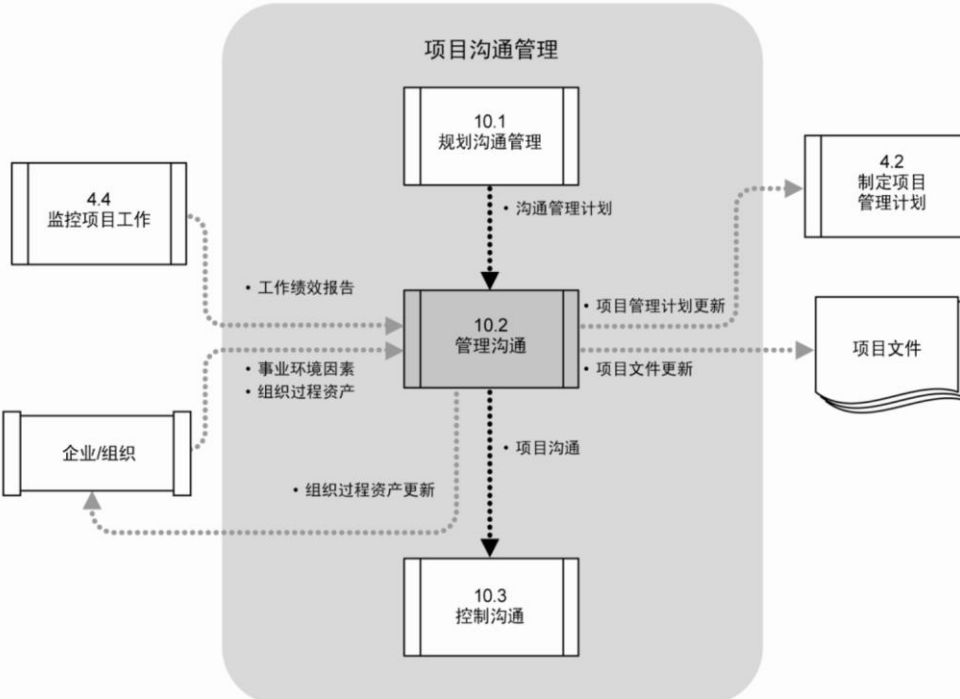

促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通

10.2 管理沟通

1 输入


- 1 沟通管理计划
- 2 工作绩效报告
- 3 事业环境因素
- 4 组织过程资产

2 工具与技术

- 1 沟通技术
- 2 沟通模型
- 3 沟通方法
- 4 信息系统
- 5 报告绩效

3 输出

- 1 项目沟通
- 2 项目管理计划更新
- 3 项目文件更新
- 4 组织过程资产更新

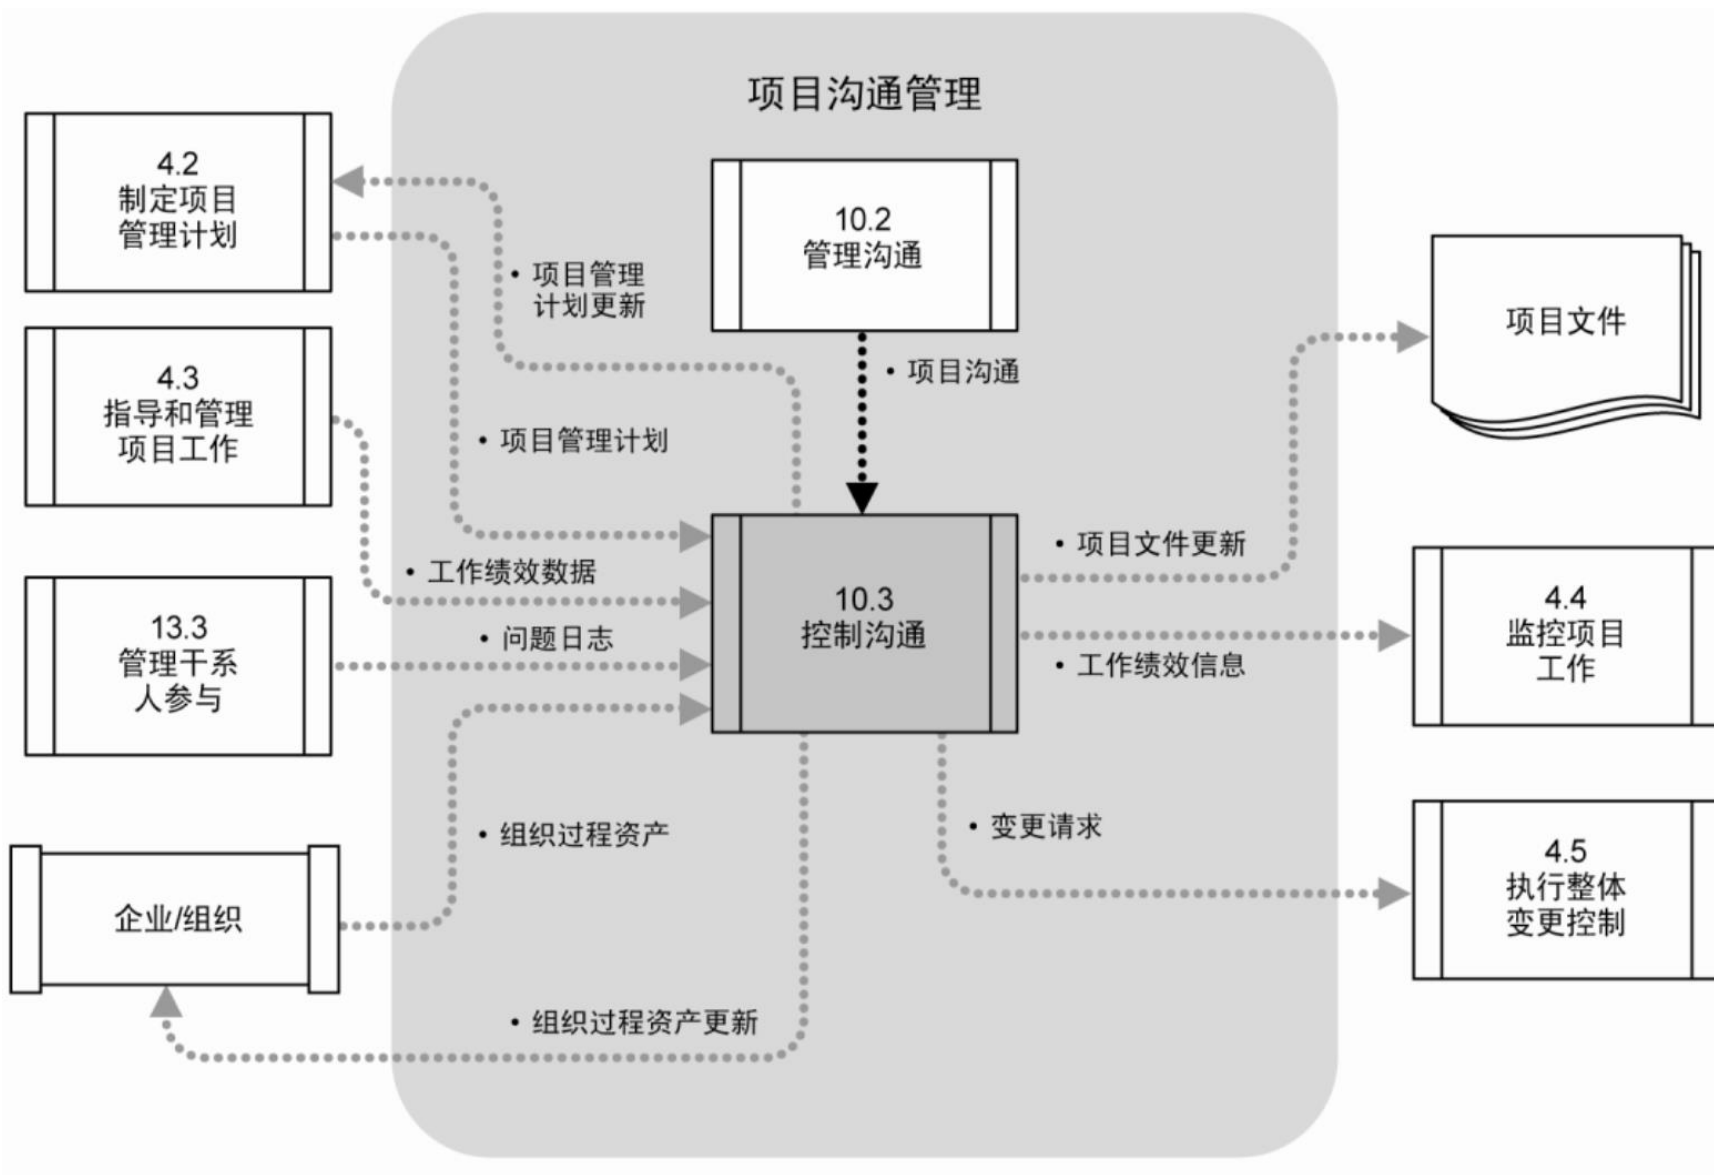

随时确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化

10.3 控制沟通

.1 输入

- .1 项目管理计划
- .2 **项目沟通**
- .3 **问题日志** (管理干系人参与的输出)
- .4 **工作绩效数据**
- .5 组织过程资产

监控

.2 工具与技术



- .1 **信息管理系统** (不限于介质, 属于FMIS)
- .2 **专家判断**
- .3 **会议**

控制沟通的目的: 对沟通进行监督

.3 输出 和控制, 满足干系人对信息的需求

- .1 **工作绩效信息**
- .2 **变更请求**
- .3 项目管理计划更新 (9.1+10.1+13.2)
- .4 项目文件更新 (预测报告、问题日志)
- .5 组织过程资产更新 (报告格式、经验教训文档)

3. 控制沟通

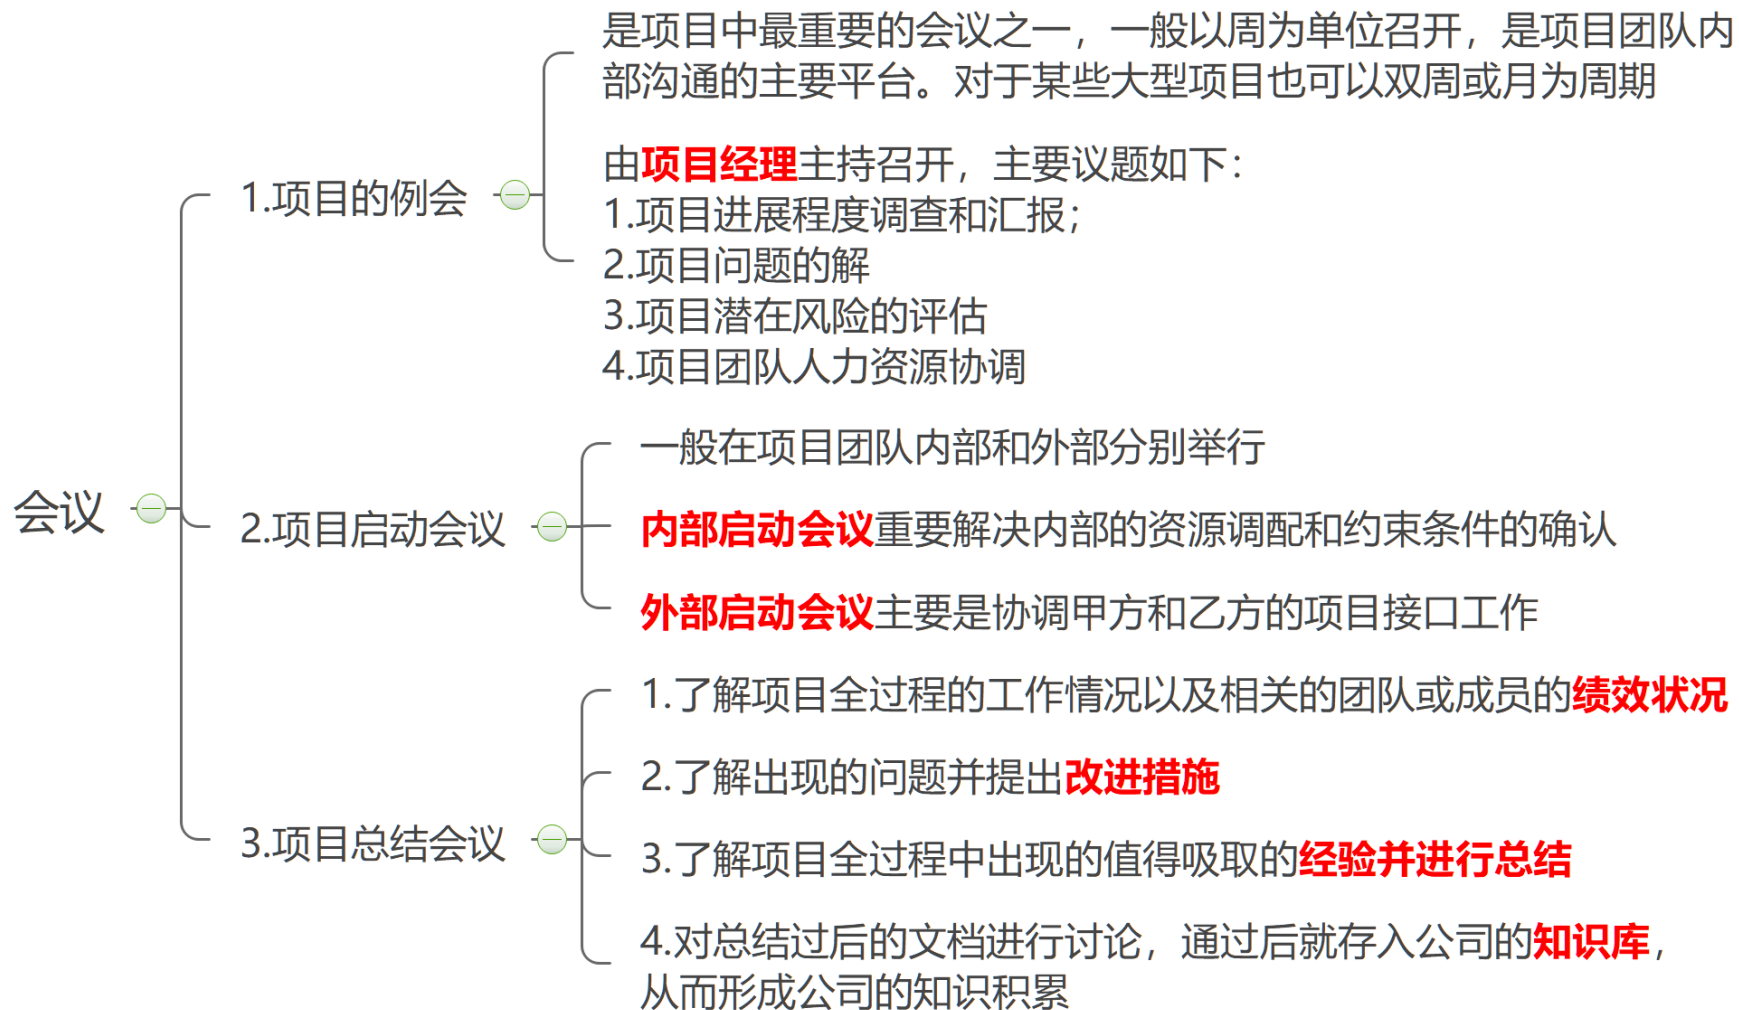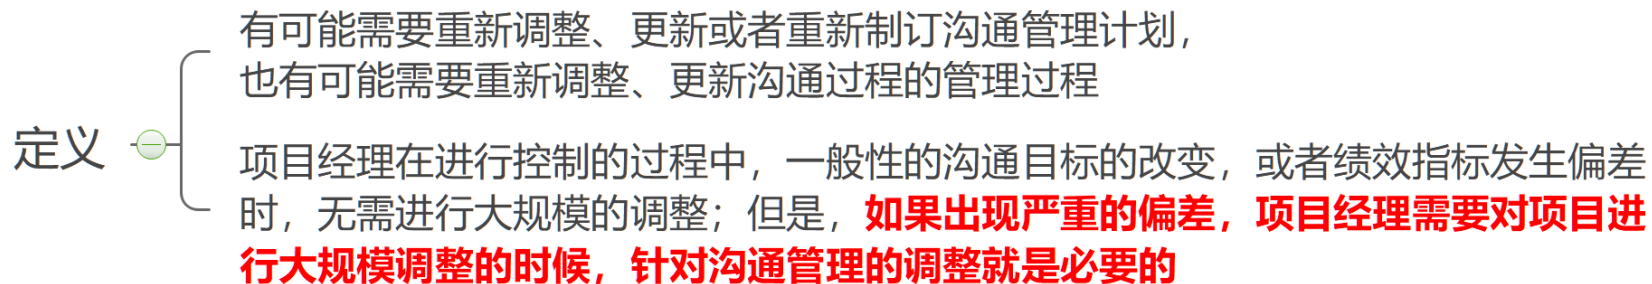

3. 控制沟通

>>> 干系人管理*ITO口诀版

13.1 识别干系人

1. 项目章程	1. 干系人分析	1. 干系人登记册
2. 采购文件	2. 专家判断	
3. 事业环境因素	3. 会议	
4. 组织过程资产		
业组采文章	人家会登记	
4	3	1

13.2 规划干系人管理

1. 项目管理计划	1. 专家判断	1. 干系人管理计划
2. 干系人登记册	2. 会议	2. 项目文件更新
3. 事业环境因素	3. 分析技术	
4. 组织过程资产		
业主管登记	分家会文划	
4	3	2

13.3 管理干系人参与

1. 干系人管理计划	1. 沟通方法	1. 问题日志
2. 沟通管理计划	2. 人际关系技能	2. 变更请求
3. 变更日志	3. 管理技能	3. 项目管理计划更新
4. 组织过程资产		4. 项目文件更新
		5. 组织过程资产更新
人通计划变日产	沟通管关系	去信来问5大件
4	3	5

13.4 控制干系人参与

1. 项目管理计划	1. 信息管理系统	1. 工作绩效信息
2. 问题日志	2. 专家判断	2. 变更请求
3. 工作绩效数据	3. 会议	3. 项目管理计划更新
4. 项目文件		4. 项目文件更新
		5. 组织过程资产更新
文划问数据	管家会5件	
4	3	5

>>> 干系人管理4W1H

4W1H	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人参与	控制关系人参与
what 做什么	识别干系人，记录其利益、影响及程度，制作一份干系人登记册和管理策略	制定一份干系人管理计划 作用：为与项目干系人的互动提供可操作的、清晰的计划，支持项目利益	在整个项目周期中，与干系人沟通和协作，满足其需要和期望，解决实际出现的问题。 作用：帮助项目经理提升来自干系人支持，把干系人的抵制降到最低，显著提高项目成功的机会	全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，调动干系人参与过程 作用：随着项目进展和环境变化，为止并提升干系人参与活动的效果和效率
why 为什么做	干系人对项目的影响要重点关注，任何对干系人的忽略都有可能导致项目失败	为管理项目干系人提供指南	获得干系人对项目的支持，把干系人的抵制降到最低，显著提高项目成功的机会	维持并提升干系人参与活动的效率和效果
who 谁来做	项目管理团队	项目管理团队/项目团队（如果项目规模比较小的话）	项目管理团队/项目团队（如果项目规模比较小的话）	项目管理团队/项目团队（如果项目规模比较小的话）
when 什么时候做	在项目进行过程中持续进行，在项目早期必须进行，项目章程制定后要识别干系人	项目早期，尽早规划项目干系人管理，降低项目风险	计划制定后，按照计划执行	贯穿项目生命周期始终
how 如何做	采用干系人分析方法，可利用干系人权力/利益方格或矩阵对干系人进行分析，干系人管理策略也可以标注在干系人分析矩阵图上，召开会议	专家判读，分析技术，会议	使用沟通方法，人际关系技能（建立信任，解决冲突，积极倾听，引导变革）和管理技能（演示技能，谈判技能，写作技能，公开演讲技能等）	信息管理系统，专家判断，会议

帮助项目经理建立对各个干系

13.1 识别干系人(自始至终)

人或干系人群体的适度关注

.1 输入

启动

- .1 项目章程
- .2 采购文件 (规划采购管理的输出)
- .3 事业环境因素
- .4 组织过程资产

干系人分析有助于了解干系人之间的关系

.2 工具与技术

- .1 干系人分析 收集信息用以确定项目中应考虑哪些人的利益
- .2 专家判断
- .3 会议 (情况分析会议)

.3 输出

- .1 干系人登记册

干系人登记册包括: 基本信息, 评估信息, 干系人分类。应定期查看并更新干系人登记册。

为与干系人的互动提供清晰且

13.2 规划干系人管理

可操作的计划, 支持项目利益

规划干系人管理主要是做沟通

.1 输入

规划

- .1 项目管理计划
- .2 干系人登记册
- .3 事业环境因素
- .4 组织过程资产
(经验教训和历史信息尤其重要)

.2 工具与技术

- .1 专家判断 用专家判断来制定行动和沟通方案, 消除干系人参与程度的差距
- .2 会议
- .3 分析技术 (不知晓、抵制、中立、支持、领导)

.3 输出

- .1 干系人管理计划
- .2 项目文件更新 (项目进度计划、干系人登记册)

干系人管理计划通常包括(除干系人登记册中的资料外): 关键干系人的所需参与程度和当前参与程度; 干系人变更的范围和影响; 干系人之间的相互关系和潜在交叉; 项目现阶段干系人沟通需求; 需要分发给干系人的信息, 包括语言、格式、内容和详细程度; 分发相关信息的理由, 以及可能对干系人参与所产生的影响; 向干系人分发所需信息的时限和频率; 随着项目的进展, 更新和优化干系人管理计划的方法

帮助项目经理提升来自干系人的支持，把干系人的抵制降到最低，显著提高项目成功的机会

13.3 管理干系人参与/关注人

1 输入

执行

1 干系人管理计划

2 沟通管理计划 (规划沟通管理的输出)

3 变更日志 (实施整体变更控制的输出)

4 组织过程资产

在与外部项目利害关系者一起工作时将使用的主要的沟通技能是公关

2 工具与技术

1 沟通方法

2 人际关系技能

3 管理技能

项目经理负责调动各干系人参与项目，并对他们进行管理，必要时可以寻求项目发起人的帮助。主动管理干系人参与可以降低项目不能实现其目的和目标的的风险。

3 输出

1 问题日志

2 变更请求 (项目本身/与干系人互动的纠正或预防措施)

3 项目管理计划更新 (干系人管理计划)

4 项目文件更新 (干系人登记册)

5 组织过程资产更新 (含项目报告)

管理干系人参与的活动包括：①调动干系人适时参与项目，以获取或确认他们对项目成功的持续承诺。②通过协商和沟通，管理干系人的期望，确保实现项目目标。③处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提出的问题，尽早识别和讨论这些关注点，以便评估相关的项目风险。④澄清和解决已识别出的问题

随着项目进展和环境变化，维持并

13.4 控制干系人参与 提升干系人参与活动的效率和效果

1 输入

监控

1 项目管理计划

2 问题日志

3 工作绩效数据

4 项目文件 (项目进度计划、干系人登记册、问题日志、变更日志、项目沟通文件)

2 工具与技术

1 信息管理系统

2 专家判断

3 会议

3 输出

1 工作绩效信息 (可交付成果状态、变更请求落实情况、预测的ETC)


2 变更请求 (推荐的纠正措施/预防措施)



3 项目管理计划更新 (除配置和过程改进外的11个管理计划)

4 项目文件更新 (干系人登记册、问题日志)

5 组织过程资产更新

组织过程资产更新：给干系人的通知、项目报告(含项目收尾报告)、项目演示资料、项目记录、干系人的反馈意见、经验教训文档(含对问题的根本原因分析、纠正理由、有关干系人管理的其他经验教训)

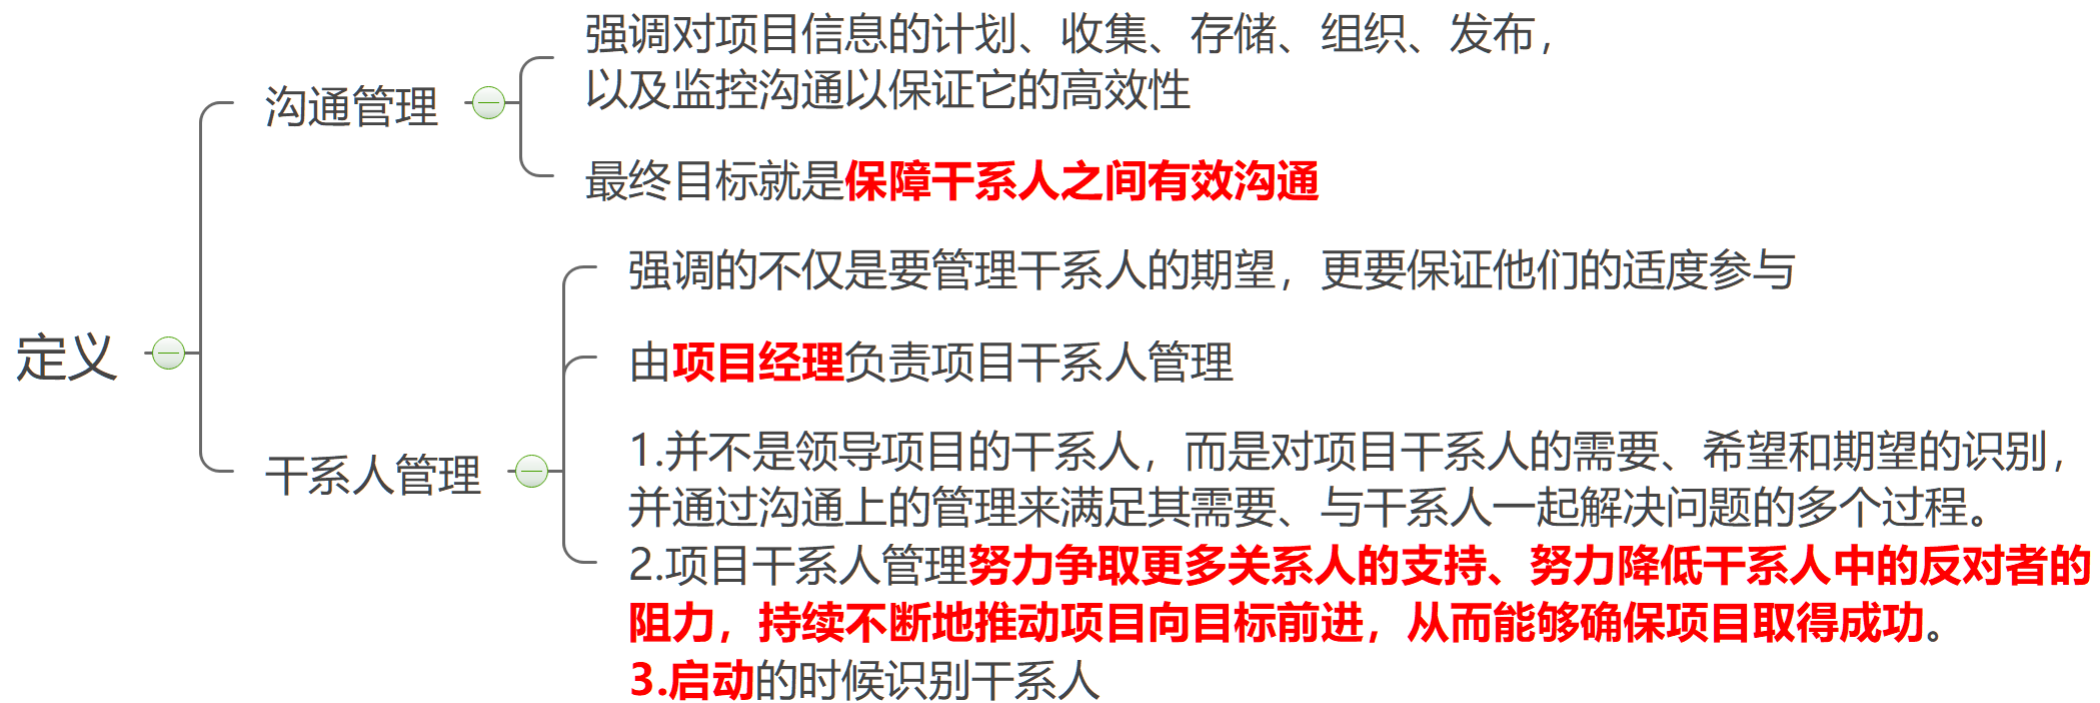

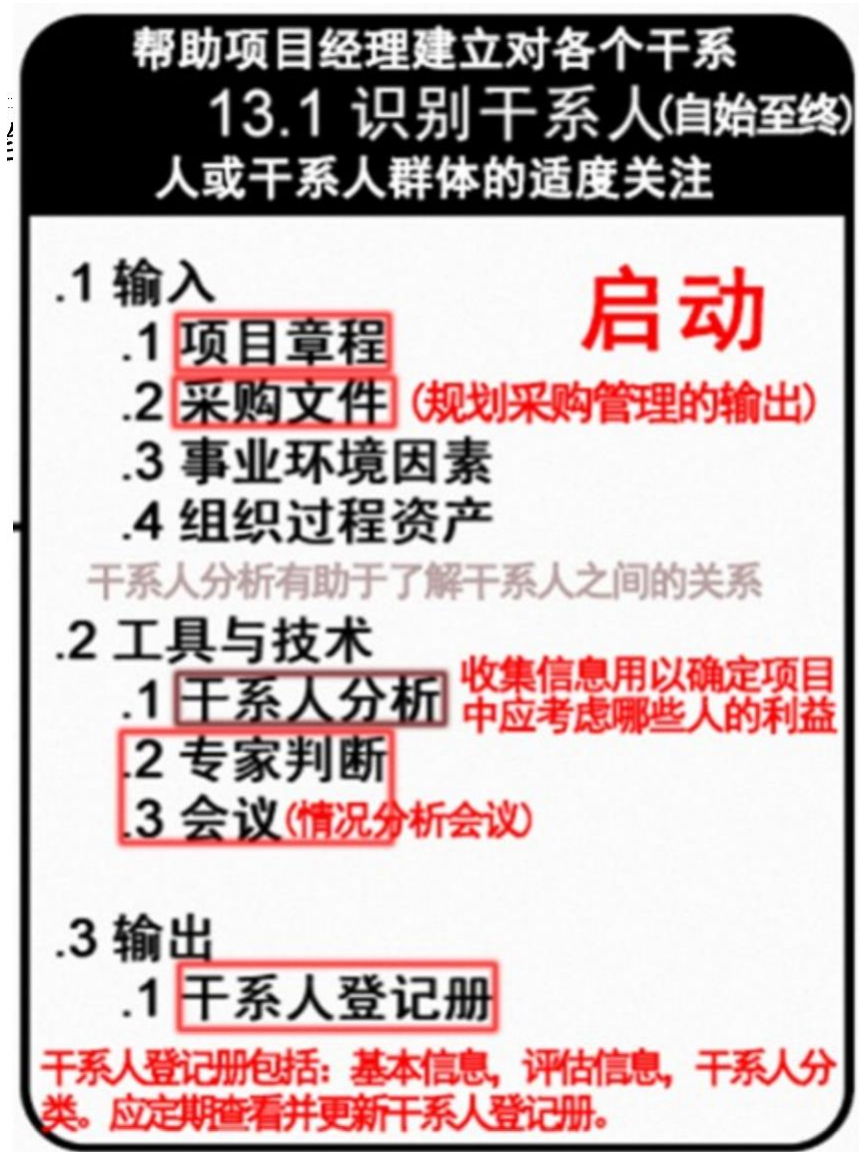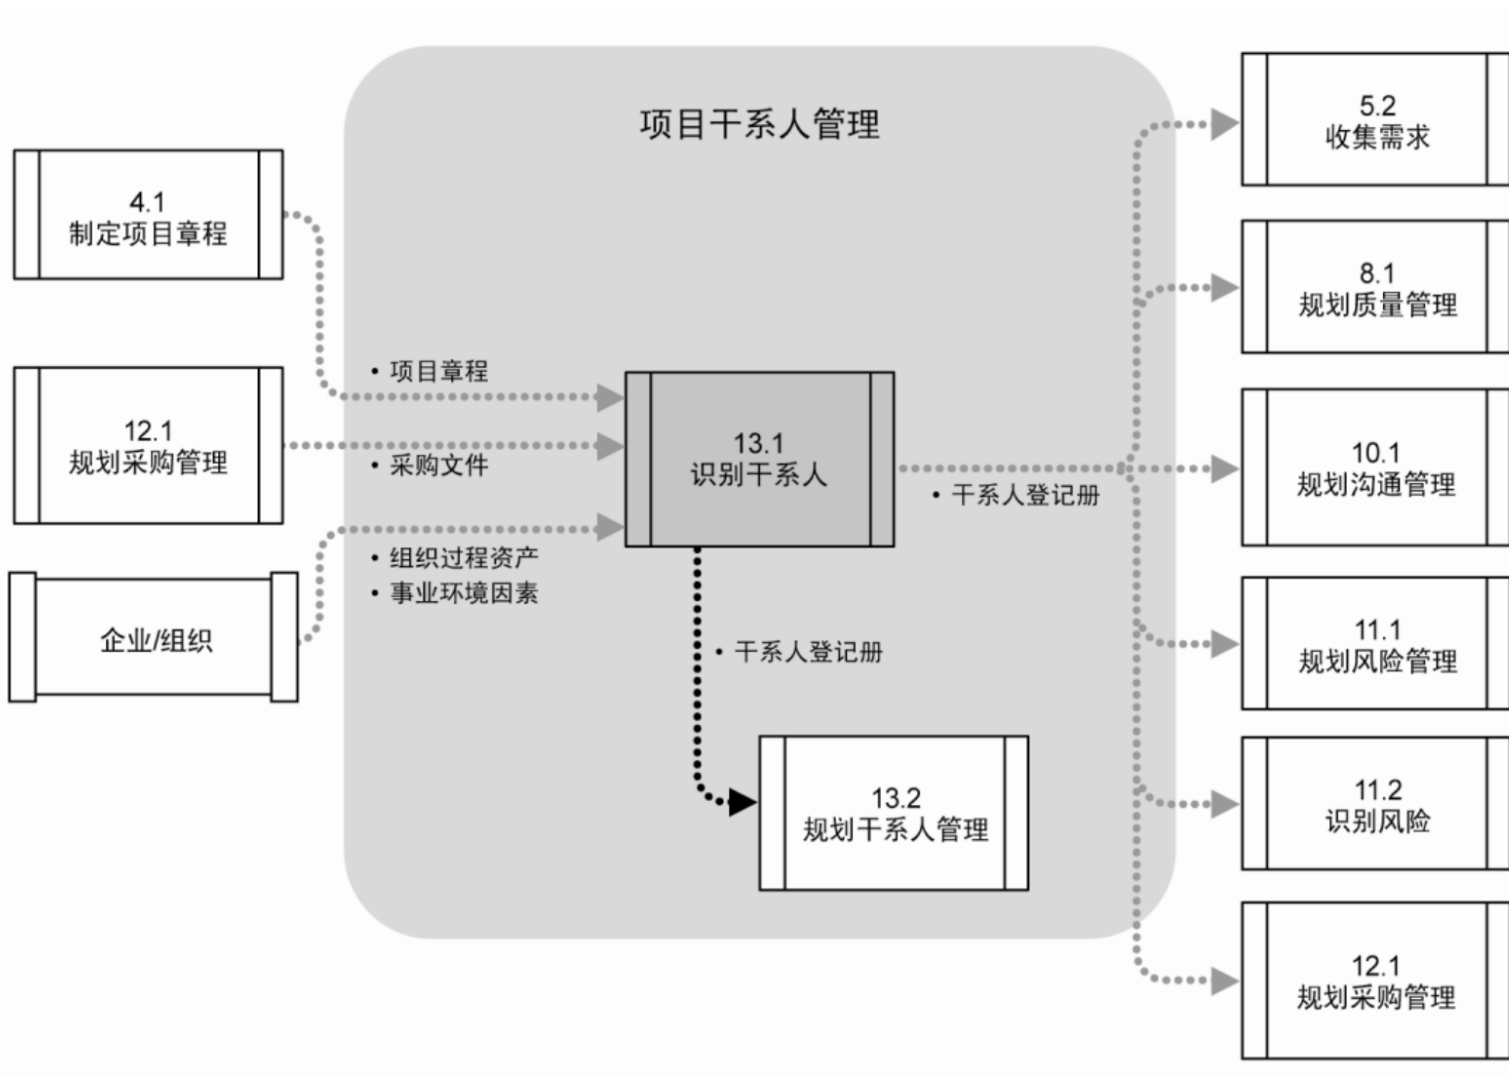

1. 识别干系人

定义

因为一次识别不能穷尽所有的项目干系人，况且项目在动态地变化着，因此应**定期检查干系人登记册，必要时补充、更新干系人登记册**，因为可能**会识别出新的干系人、也可能调整登记册**

干系人
分析步骤

- ①识别全部潜在项目干系人及其相关信息
- ②识别每个干系人可能产生的影响或提供的支持
- ③评估关键干系人对不同情况可能做出的反应或应对

- **权力--职权**
- **利益--对项目结果的关注程度**
- **影响--主动参与项目的程度**
- **作用--改变项目计划或执行的能力**

干系人
分类模型

- ①**权利/利益方格**
 - 根据干系人的职权大小和对项目结果的关注（利益）程度进行分类
 -
 - B区（重点管理、及时汇报）**
项目的客户和项目经理的主管领导
 - C区（随时告知）**
 - A区（令其满意）**
 - D区（化最少的精力来监督他们）**
- ②**权利/影响方格**
 - 干系人的职权大小以及主动参与（影响）项目的程度进行分类
- ③**影响/作用方格**
 - 干系人主动参与（影响）项目的程度及改变项目计划或者执行的能力进行分类
- ④**凸显模型**
 - 根据干系人的权力（施加自己意愿的能力）、紧迫程度和合法性对干系人进行分类

- **权高利低----让他爽**
- **权低利高----常告知**
- **权高利高----重管理**
- **权低利低----仅监督**

C：股民、小米手机粉丝

1. 识别干系人


【C—当前参与程度 D—所需参与程度】

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1	C			D	
干系人 2			C	D	
干系人 3				D C	

干系人参与
评估矩阵





干系人 分析技术

- ① 不了解 — 对项目和潜在影响不知晓
- ② 抵制 — 了解项目和潜在影响，抵制项目
- ③ 中立 — 了解项目，既不支持，也不反对
- ④ 支持 — 了解项目和潜在影响，支持项目
- ⑤ 领导 — 了解项目和潜在影响，积极致力于保证项目成功


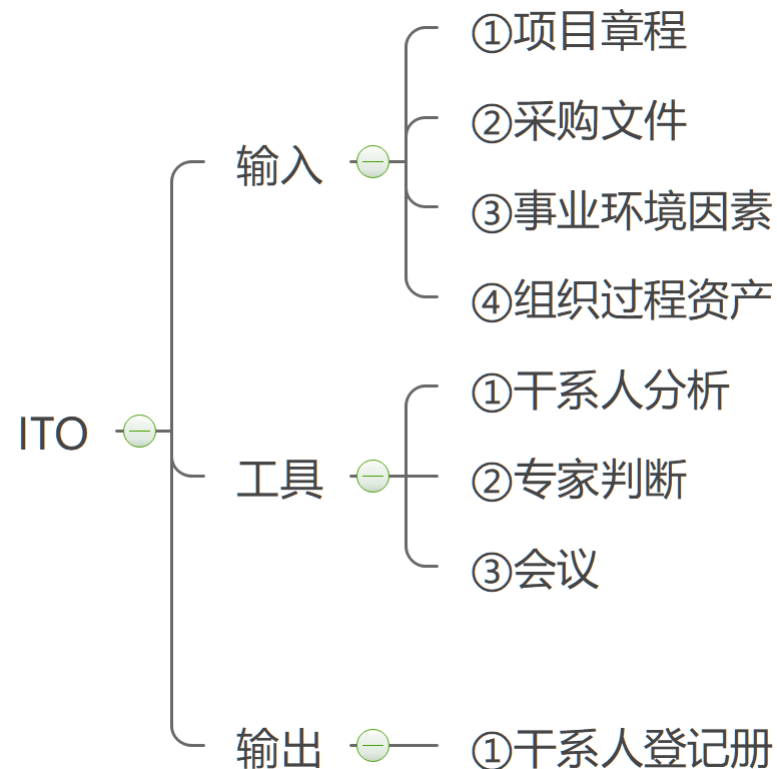



- 可在干系人参与评估矩阵中**记录**干系人的当前**参与程度**。
- 通过分析，**识别**出当前参与程度与所需参与程度之间的**差距**。
- 项目团队可以使用**专家判断**来制定行动和沟通方案，以**消除**上述**差距**。

1. 识别干系人

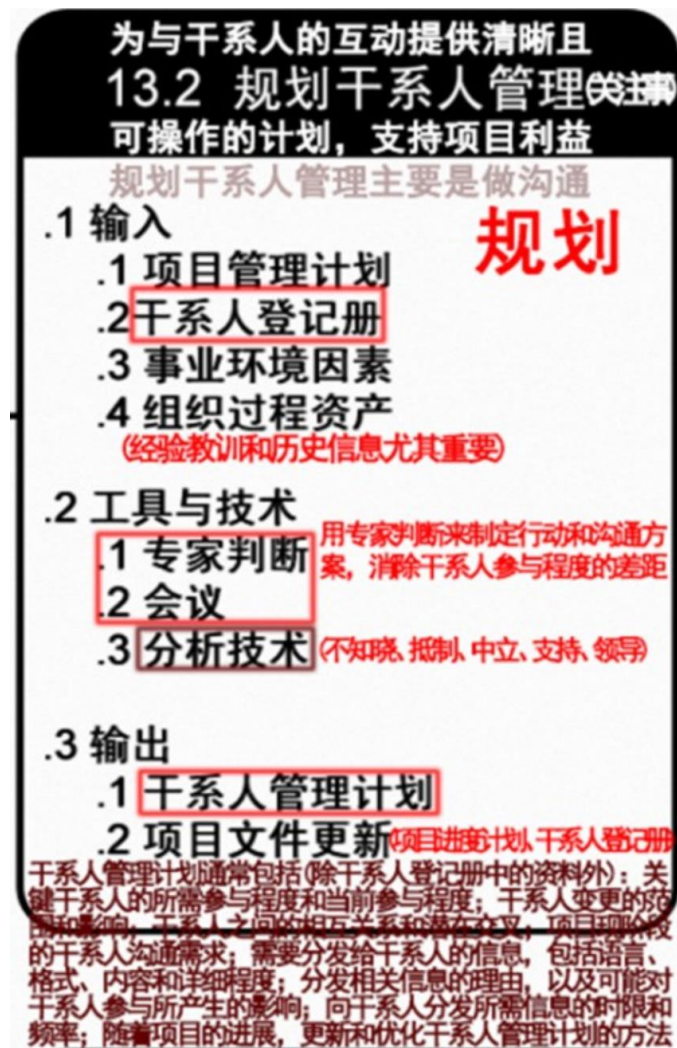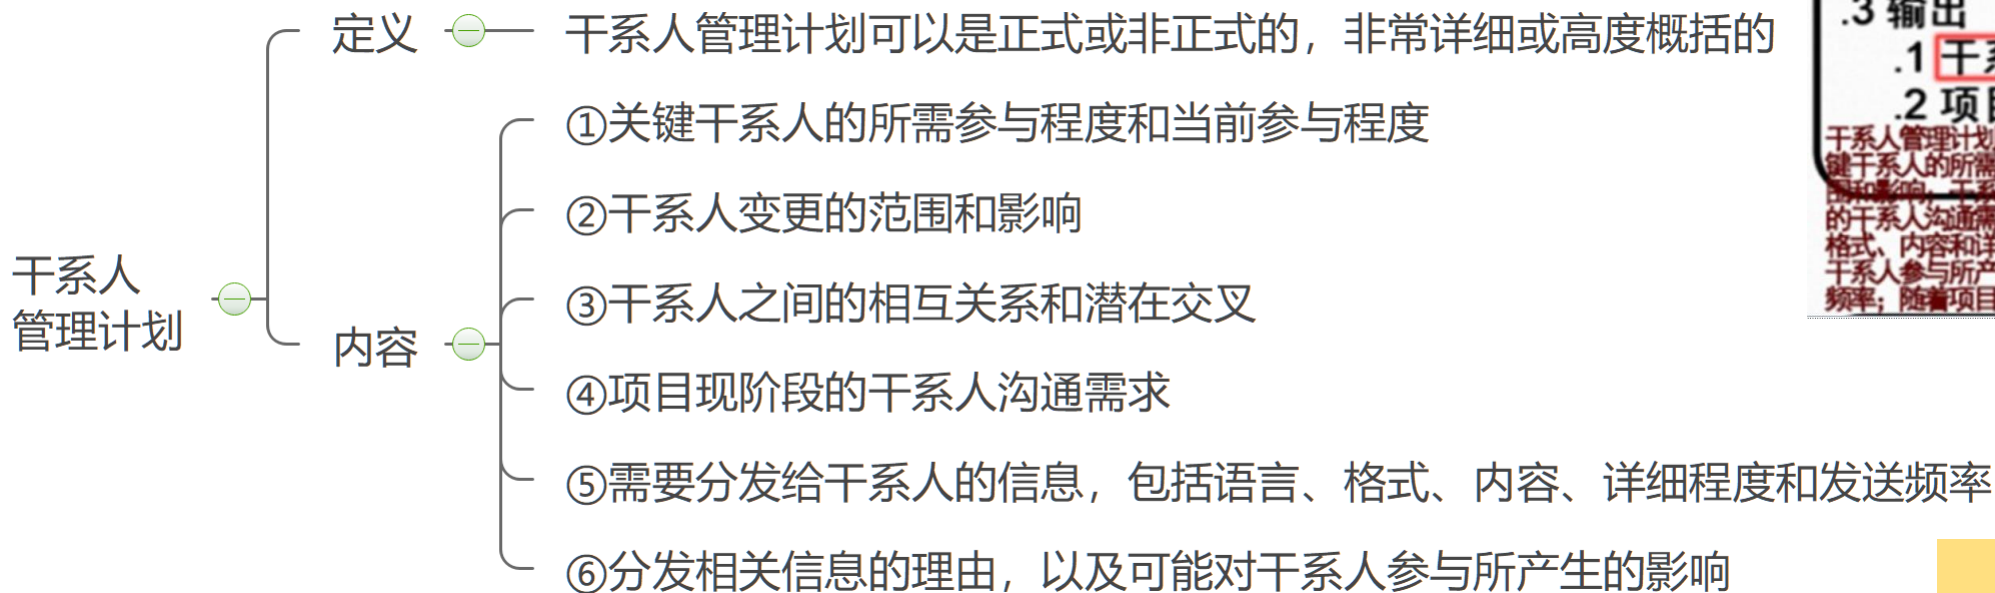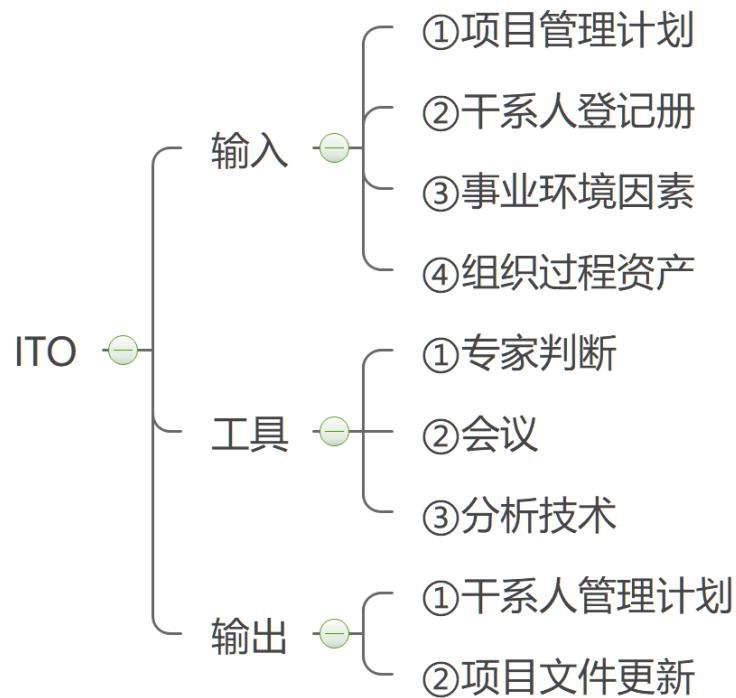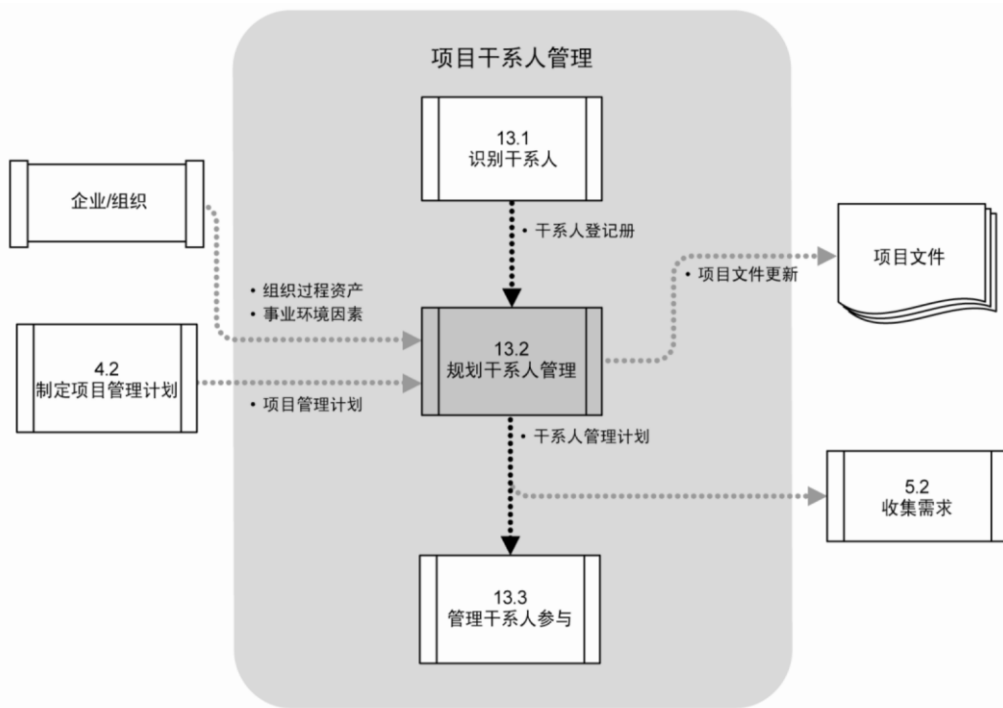

2. 规划干系人管理

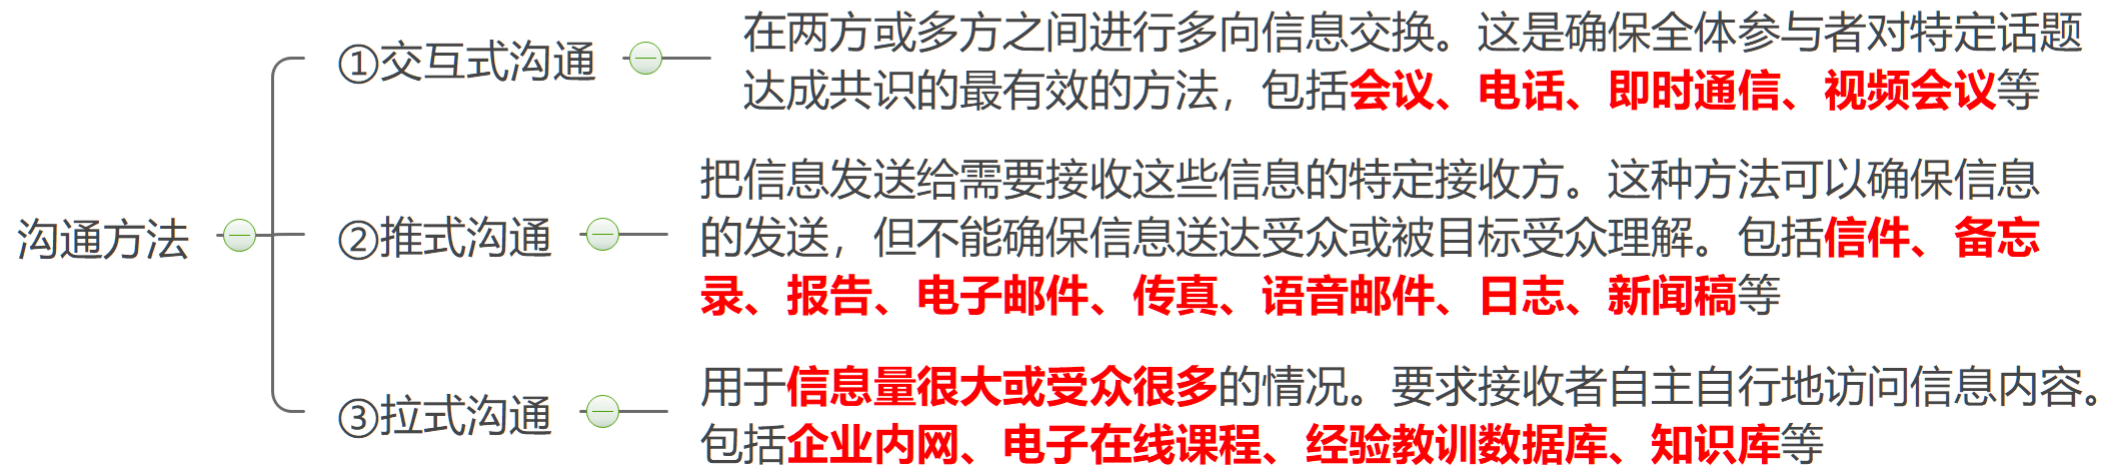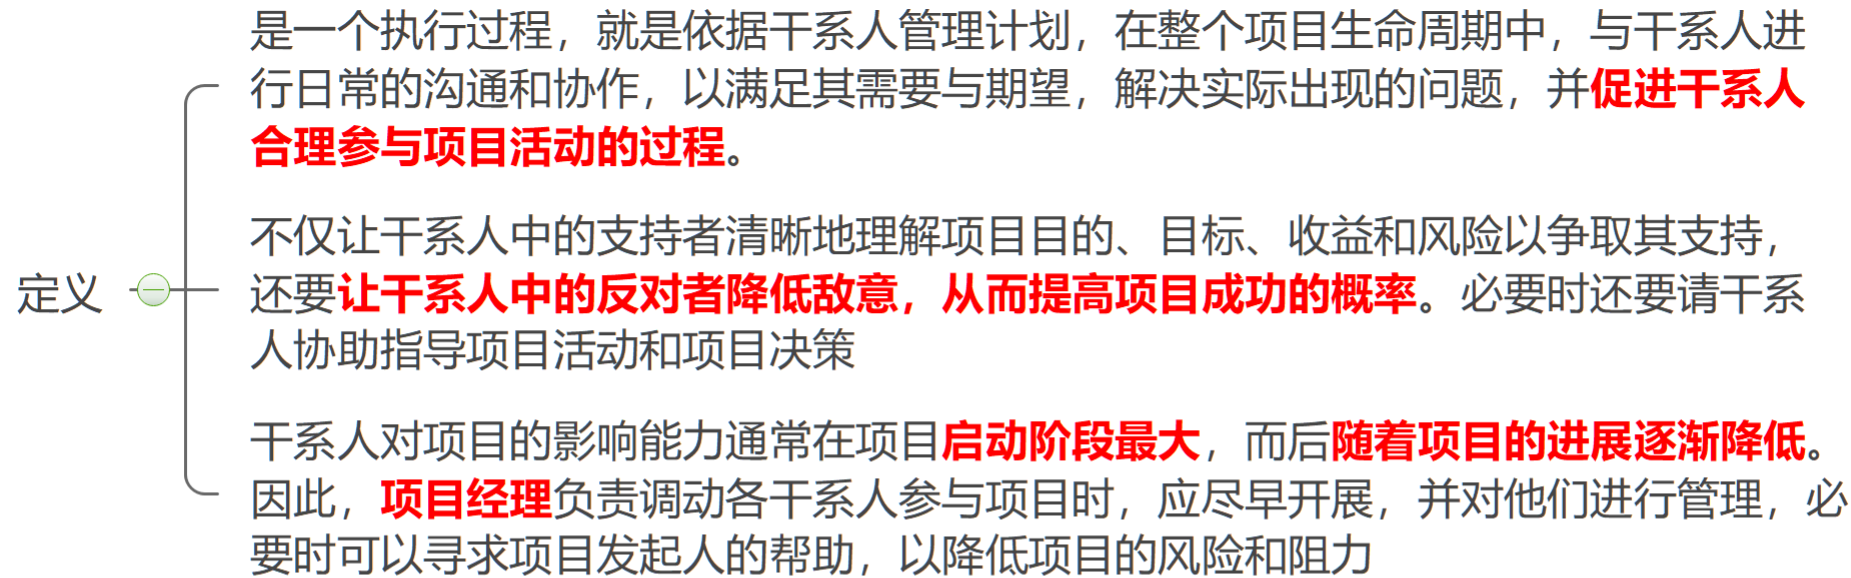

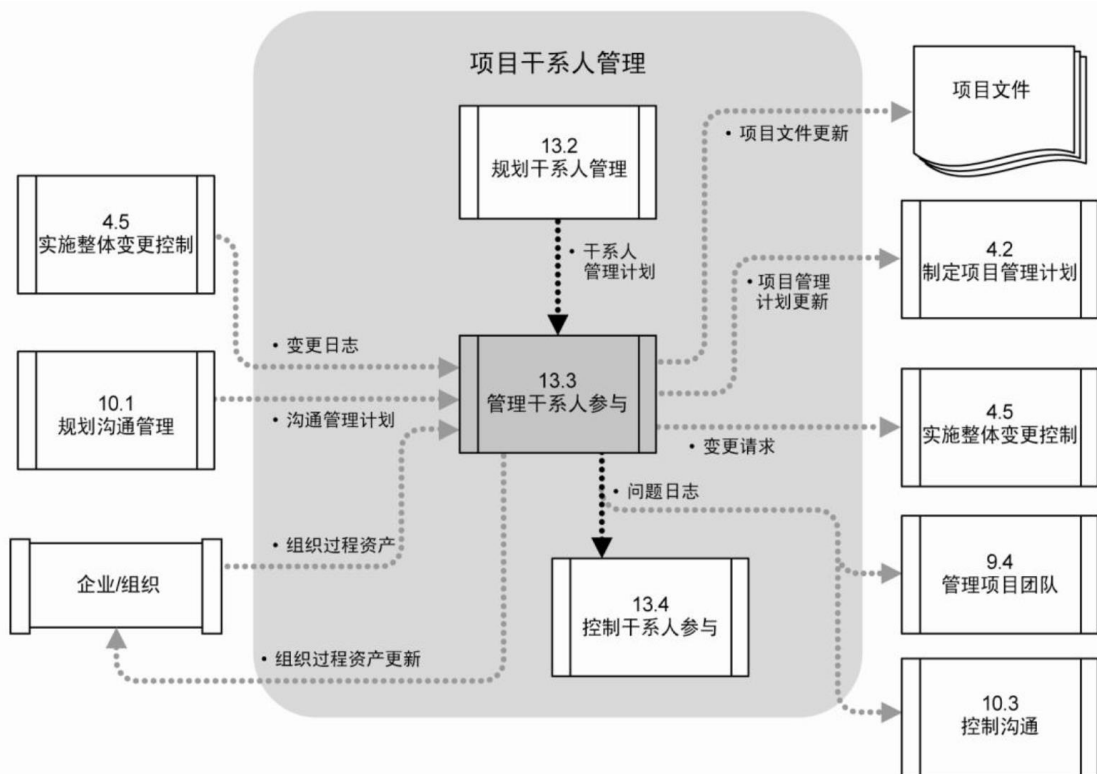

帮助项目经理提升来自干系人的支持，把干系人的抵制降到最低，显著提高项目成功的机会

13.3 管理干系人参与

1 输入

- 1 干系人管理计划
- 2 沟通管理计划 (规划沟通管理的输出)
- 3 变更日志 (实施整体变更控制的输出)
- 4 组织过程资产
在与外部项目利害关系者一起工作时将使用的主要的沟通技能是公共

执行

2 工具与技术

- 1 沟通方法
- 2 人际关系技能
- 3 管理技能

项目经理负责调动各干系人参与项目，并对他们进行管理。必要时可以寻求项目发起人的帮助。主动管理干系人参与可以降低项目不能实现其目的和目标的风险。

3 输出

- 1 问题日志
- 2 变更请求 (项目本身与干系人互动的纠正或预防措施)
- 3 项目管理计划更新 (干系人管理计划)
- 4 项目文件更新 (干系人登记册)
- 5 组织过程资产更新 (含项目报告)

管理干系人参与的活动包括：①调动干系人适时参与项目，以获取或确认他们对项目成功的持续承诺。②通过协商和沟通，管理干系人的期望，确保实现项目目标。③处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提出的问题，尽早识别并讨论这些关注点，以便评估相关的项目风险。④澄清和解决已识别出的问题。


输入

工具

输出

- ①干系人管理计划
- ②沟通管理计划
- ③变更日志
- ④组织过程资产
- ①沟通方法
- ②人际关系技能
- ③管理技能
- ①问题日志
- ②变更请求
- ③项目管理计划更新
- ④项目文件更新
- ⑤组织过程资产更新

3.管理干系人参与

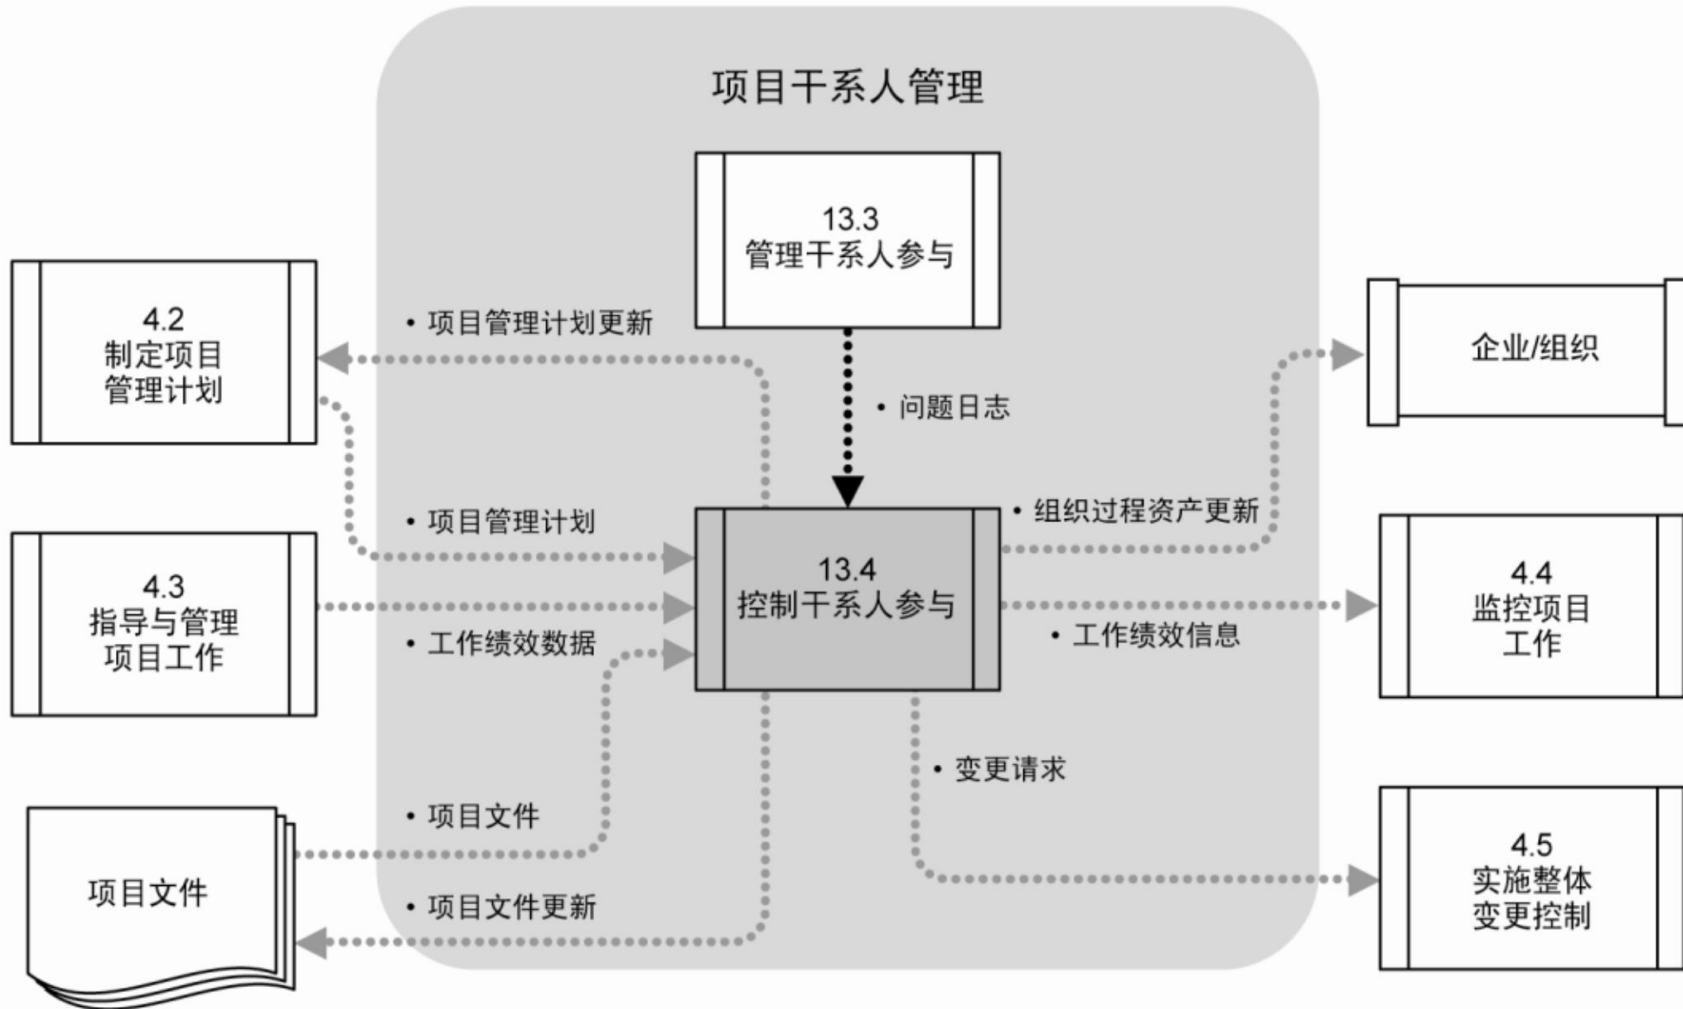

4.控制干系人参与

随着项目进展和环境变化，维持并
13.4 控制干系人参与
提升干系人参与活动的效率和效果

监控

.1 输入

.1 项目管理计划

.2 问题日志

.3 工作绩效数据

.4 项目文件
项目进度计划、干系人登记册、问题日志、变更日志、项目沟通文件

.2 工具与技术

.1 信息管理系统

.2 专家判断

.3 会议

.3 输出

.1 工作绩效信息
可交付成果状态、变更请求落实情况、预测的ETC

.2 变更请求
推荐的纠正措施/预防措施

.3 项目管理计划更新
除配置和过程改进外的11个管理计划

.4 项目文件更新
干系人登记册、问题日志

.5 组织过程资产更新

组织过程资产更新：给干系人的通知、项目报告(含项目收尾报告)、项目演示资料、项目记录、干系人的反馈意见、经验教训文档(含对问题的根本原因分析、纠正理由、有关干系人管理的其他经验教训)

- 定义 — 应该使用在沟通管理计划中确定的针对每个干系人的沟通方法

- 高效会议

1. 事先制定例会制度
2. 放弃可开可不开的会议
3. 明确会议的地点和期望结果
4. 发布会议通知
5. 在会议之前将会议资料转发给参会人员
6. 可以借助视频设备
7. 明确会议规则：主持人、职责、有效控制、活跃的会议气氛
8. 会后要有总结落实
9. 会议要有纪要
10. 做好会议的后勤保障

输入

- ① 项目管理计划
- ② 问题日志
- ③ 工作绩效数据
- ④ 项目文件

工具

- ① 信息管理系统
- ② 专家判断
- ③ 会议

输出

- ① 工作绩效信息
- ② 变更请求
- ③ 项目管理文件更新
- ④ 项目文件更新
- ⑤ 组织过程资产更新

4. 控制干系人参与

>>> 练一练

【例1-18上】沟通过程管理的最终目标是（）。

- A.严格执行沟通计划
- B.保障干系人之间有效沟通
- C.与干系人建立沟通机制
- D.正确传递项目信息

【例2-18上】关于干系人管理的描述。不正确的是（）。

- A.干系人分析在项目立项时进行，以便尽早了解干系人对项目的影响
- B.识别干系人的方法包含组织相关会议、专家判断、干系人分析等
- C.干系人分析是系统地收集干系人各种定性和定量信息的一种方法
- D.典型的项目干系人包含客户、用户、高层领导、项目团队和社会成员等


【例3-18下】关于管理沟通的工具,不正确的是（）。

- A.沟通模型的各要素会影响沟通的效率和效果
- B.管理沟通过程中要确保已创建并发布的信息能够被接受和理解
- C.项目经理在项目进行中,应定期或不定期进行绩效评估
- D.为了方便快捷地进行沟通,项目进行过程中需选择固定的沟通渠道

>>> 练一练

【例4-18下】下图干系人权力和利益的描述,不正确的是 ()。

- A.项目经理的主管领导就是A区的干系人,要“令其满意”
- B.项目客户是B区的干系人,要“重点管理、及时报告”
- C.对于C区的干系人,要“随时告知”
- D.对于D区干系人,花费最少的精力监督即可

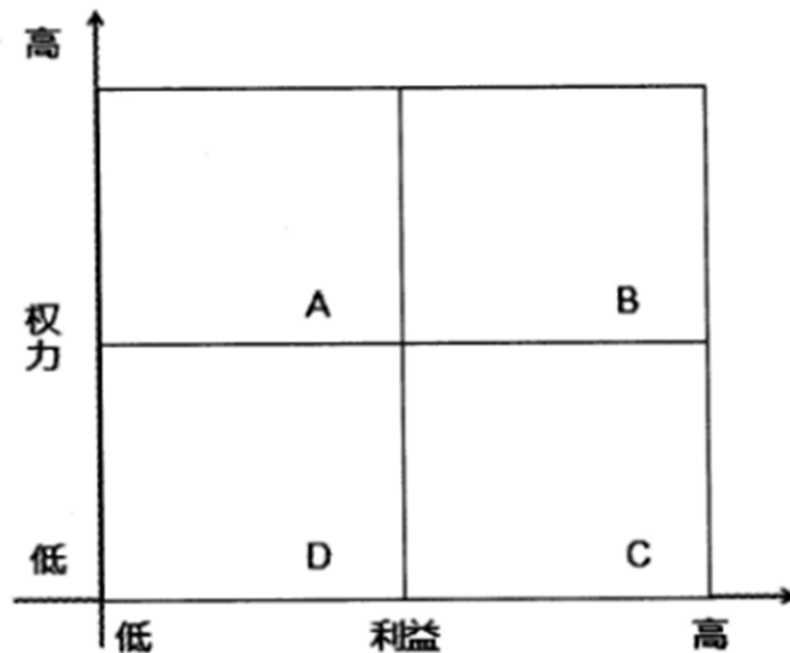

【例5-19上】项目团队中原来有5名成员,后来又有4人加入项目,与之前相比项目成员之间沟通渠道增加 () 条。

- A.26 B.10 C.20 D.36

>>> 练一练

【例6-19上】识别项目干系人的活动按时间先后排序正确的是（）。

- ①对干系人分类 ②识别干系人及其信息
③制定干系人管理计划 ④评估关键干系人的诉求和影响力
- A.④③②① B.②④①③ C.①②③④ D.②①④③

【例7-19下】关于沟通表达方式的描述，不正确的是（）。

- A.文字沟通的优点是读者可以根据自己的速度进行调整
B.文字沟通的缺点是无法控制何时，以及是否被阅读
C.语言沟通的优点是节省时间，因为语言速度高于阅读速度
D.语言沟通的缺点是达不到文字资料的精确性和准确性

【例8-19下】对项目干系人进行分类时，常用的分类方法不包括（）。

- A.权利/利益方格 B.权利影响方格 C.影响/作用方格 D.影响/意愿方格

>>> 练一练

【例9-20下】召开视频会议属于（）沟通。

A.非正式 B.拉式 C.推式 D.交互式

【例10-20下】根据干系人权力/利益方格分析,某手机厂商对于其品牌的忠实粉丝及未来潜在用户,应该采取的管理方式是（）。


A.随时告知 B.重点管理 C.监督 D.令其满意

>>> 参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	A	A	B	C	D	D	A

非常感谢您的聆听

加入正版课程获得VIP全套增值服务



问题咨询联系江山老师 QQ/微信：51815498 /915446173



江山老师答疑微信



官方公众号



备份公众号

扫一扫
加关注
抢先学
早拿证



微信扫码做题
